

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年10月9日

計画の名称	安全・安心、快適な環境のまちづくり		
計画の期間	平成25年度～平成29年度(5年間)	交付対象	富士見市
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。		

計画の成果目標（定量的指標）	黒字・・・計画 赤字・・・実績
①別所雨水ポンプ場の機器等の増設更新工事の実施率を0%（H24）から100%（H29）に増加させる。 ②下水道による都市浸水対策達成率を28%（H24）から30%（H29）に増加させる。	

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
①別所雨水ポンプ場の機器等の増設更新工事の実施率 増設更新工事実施箇所（0箇所）／（1箇所）	0.0% 0.0%	50.0% 50.0%	100.0% 100.0%	
②下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済面積（239.4ha）／浸水対策を実施すべき面積（849ha）	28.0% 28.0%	29.0% 29.1%	30.0% 29.5%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	2,175百万円 1,182百万円	A	2,175百万円 1,182百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	---------------	----------------------	---	----------------------	---	------	---	------	---	------	-----------------------------	------


事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
富士見市下水道事業審議会	令和元年10月9日
	公表の方法
	富士見市ホームページによる

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・新河岸川第五排水区の雨水管整備では、平成23年度に事業計画区域の拡大をし、浸水対策を図るため雨水幹線の整備をした (L=270.2m) ・別所雨水ポンプ場のポンプ増設事業を実施した結果、水谷東地域及び水子地域における快適な暮らしの実現に大きく寄与している。 ・新河岸川第一排水区の雨水管整備では、平成25年度に事業計画区域の拡大をし、浸水対策を図るため雨水幹線の整備をした (L=784.64m) 			黒字・・・計画 赤字・・・実績	
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	平成27・28年度の2箇年継続事業により実施し、目標を達成した。	
		最終実績値	100.0%			
	指標②	最終目標値	30.0%	目標値と実績値に差が出た要因	市街化区域に隣接している市街化調整区域の雨水整備を優先したため目標未達成になった。	
		最終実績値	29.5%			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		平成25年度から平成29年度までの5年間の整備面積は32.47haで、その内訳は、市街化区域が11.62ha、市街化調整区域が20.85haである。 これにより、整備済排水区域面積は271.87ha (=239.4ha+32.47ha) となった。 市街化調整区域を含めると、浸水対策達成率は、浸水対策完了済面積(271.87ha) / 浸水対策を実施すべき面積(849ha+20.85ha) = 31.3%となる。				
3. 特記事項 (今後の方針等)						
<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度から平成29年度までの5年間で本計画「安全・安心、快適な環境のまちづくり」を実施し、別所雨水ポンプ場の機器等の増設更新工事の成果目標を達成することができた。 ・平成30年度に別所雨水ポンプ場をはじめ、全ての下水道施設を対象としたストックマネジメント全体計画を策定した。今後は管渠の更新事業にも取り組んでいく。 ・安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造するため、次期(平成30年度～令和4年度)社会資本総合整備計画においても、引き続き公共下水道の整備に取り組む。 						

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全)

計画の名称	安全・安心、快適な環境のまちづくり		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	富士見市

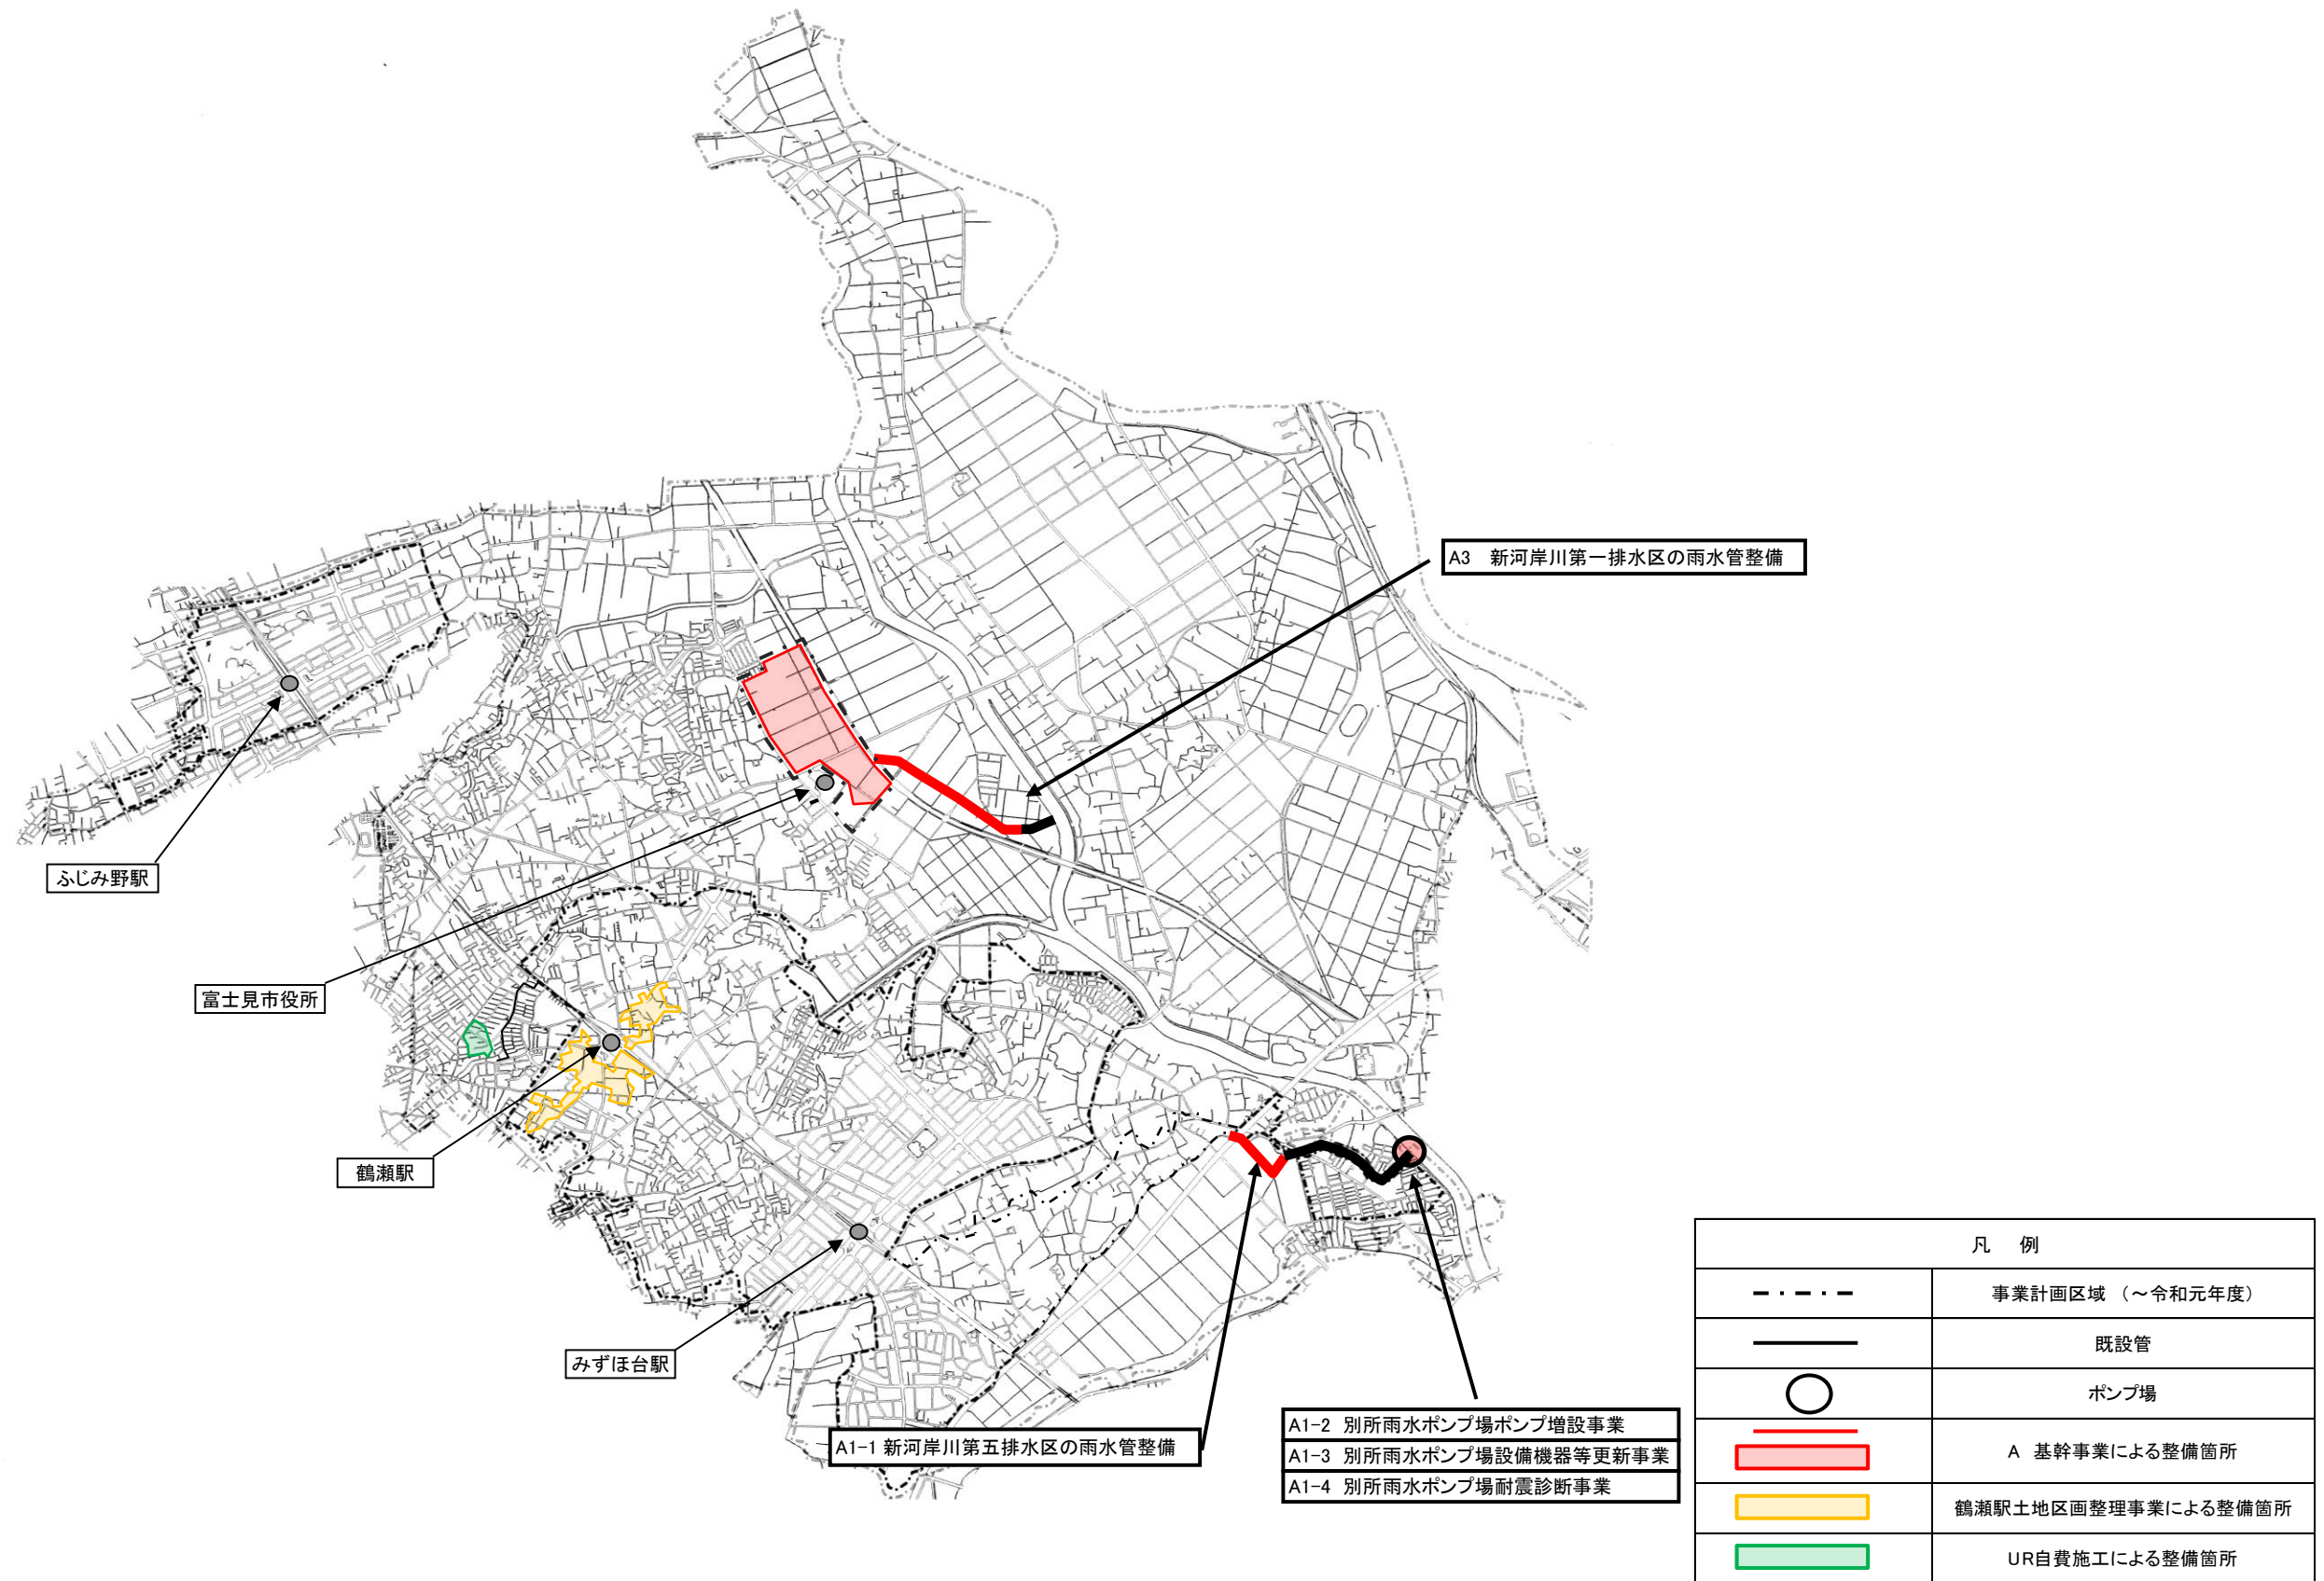

ふじみ野駅

富士見市役所

鶴瀬駅

みずほ台駅

A3 新河岸川第一排水区の雨水管整備

A1-1 新河岸川第五排水区の雨水管整備

A1-2 別所雨水ポンプ場ポンプ増設事業
 A1-3 別所雨水ポンプ場設備機器等更新事業
 A1-4 別所雨水ポンプ場耐震診断事業
